

— Geveloplossingen

Buitenspouwblad droogstapelen

Checklist Wkb



Opdrachtgever:

Datum:

Projectnummer:

Projectomschrijving:

Adres:

Vorbereidingsfase

Zijn de constructieve gegevens van de buitengevels beoordeeld door de hoofdconstructeur en toegevoegd aan het projectdossier?

JA

NEE **Actie ondernemen** - Constructieve gegevens met akkoord hoofdconstructeur aan het projectdossier toevoegen.

Productcertificaten van de binnenspouwblad-elementen en de toegepaste spouwmuurisolatie aan het projectdossier toevoegen.

Zijn er projectspecifieke risico's? Bijvoorbeeld over de constructie, bevestiging van het binnenspouwblad aan de draagconstructie.

JA Geef ze door aan het uitvoeringsteam en handel ze af in de betreffende actie.

Voldoet de verankering van het binnenspouwblad aan de hoofddraagconstructie aan de voorschriften van de constructeur? (leg de verankering vast)

JA Maak foto's.

NEE **Actie ondernemen** - Afstemmen met constructeur. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier. Foto's maken.

Uitvoeringsfase

Is de constructieve uitvoering van de buitengevel volgens berekening/tekening?

- JA** Maak (overzicht)foto's van de gevelconstructie.
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen constructeur. Maatregelen vastleggen in projectdossier. Foto's maken.

Is de luchtdichtheid van binnenspouwblad voldoende gewaarborgd?

- JA** Maak foto's (leg minimaal de aansluitingen vast).
- NEE** **Actie ondernemen** - Maatregelen vastleggen in projectdossier. Foto's maken.
- NVT** Reden noteren.

Voldoet de thermische spouwisolatie aan de isolatieberekening en is thermische spouwisolatie aangebracht volgens de voorschriften van de fabrikant aangebracht en voldoende bevestigd.

- JA** Neem isolatieberekening op in projectdossier. Maak foto's.
- NEE** **Actie ondernemen** - Maatregelen vastleggen in projectdossier. Foto's maken.
- NVT** Reden noteren.

Is het dilatatieadvies aanwezig en worden de dilataties correct uitgevoerd?

- JA** Neem dilatatieadvies op in projectdossier. Foto's maken van verticale (vertande) en eventuele horizontale dilataties.
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met Wienerberger, metselaar en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.

Is het spouwankeradvies aanwezig en worden de spouwankers d.m.v. verankeringsclips correct aangebracht?

- JA** Neem spouwankeradvies op in projectdossier. Foto's maken (minimaal van aangebrachte spouwankers).
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met fabrikant, constructeur, metselaar en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.

Worden de bakstenen van Wienerberger toegepast (sortering, formaat en kleur) en komt de orderbon (in de basis) overeen met het advies?

- JA** Neem spouwankeradvies op in projectdossier. Foto's maken (minimaal van aangebrachte spouwankers).
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met fabrikant, constructeur, metselaar en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.

Is de ondergrond voor het buitenspouwblad vlak?

- JA** Maak foto's.
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met fabrikant, constructeur, metselaar en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.
- NVT** Reden noteren.

Is een proefmuur op de bouwlocatie aanwezig, uitgevoerd volgens tekeningen?

- JA** Foto van de proefmuur.
- NEE** **Actie ondernemen** - Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier. Foto's maken.
- NVT** Reden noteren.

Worden bij de lateioplegpunten lateistenen toegepast?

- JA** Foto's maken.
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met fabrikant, aannemer en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.
- NVT** Reden noteren.

Worden stalen lateien d.m.v. glijfolie opgelegd?

- JA** Foto's maken.
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met aannemer, metselaar en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.
- NVT** Reden noteren.

Zijn de geveldrager en/ of metselwerkondersteuning(en) aangebracht overeenkomstig de voorschriften van de geveldragerleverancier?

- JA** Foto's maken.
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met fabrikant, aannemer en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.
- NVT** Reden noteren.

Worden folies en afwateringsslabben t.p.v. gevelopeningen (deur-en raamkozijnen) op correcte wijze aangebracht?

- JA** Foto's maken.
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met aannemer, metselaar en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.
- NVT** Reden noteren.

Zijn de muurbeëindigingsbeugels t.p.v. dakranden en gevelopeningen correct aangebracht?


- JA** Foto's maken.
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met aannemer, metselaar en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.
- NVT** Reden noteren.

Zijn de aansluitingen van het buitenspouwblad plaatse van opgaand werk waterkerend uitgevoerd?

- JA** Foto's maken.
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met aannemer, metselaar en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.
- NVT** Reden noteren.

Voldoet de droog gestapelde buitengevel aan eisen van regelmatigheid en vlakheid?

- JA** Foto's maken.
- NEE** **Actie ondernemen** - Afstemmen met aannemer, metselaar en kwaliteitsborger. Maatregelen moeten worden vastgelegd in het projectdossier.
- NVT** Reden noteren.

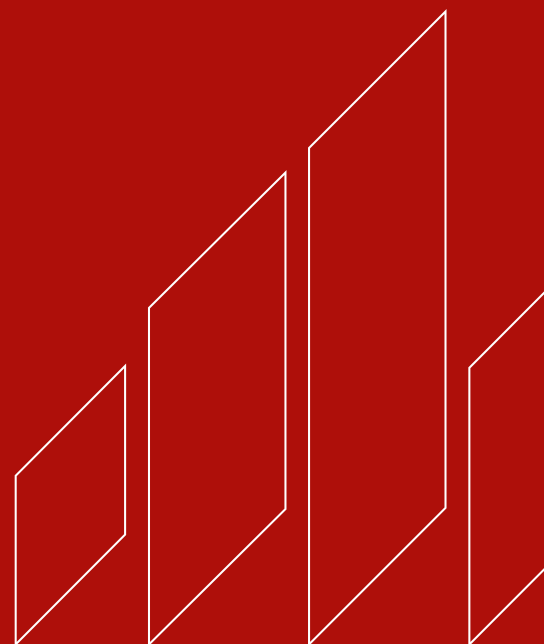

Wienerberger B.V.
088 - 118 51 00
info.nl@wienerberger.com
wienerberger.nl

